

INFORME SETMANAL D'OBRA

14/06/2016 - 20/06/2016

OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA

INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA


Emplaçament

Les obres de rehabilitació d'un tram del carrer Calàbria es localitzen al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) fins a arribar a l'encreuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova; el que correspon a una superfície total d'actuació de 1.900m².

Objecte de l'obra

Les obres tenen per objecte la modificació de la secció actual per crear unes zones amb prioritat pels vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les xarxes soterrades existents al nou nivell de paviment. Addicionalment, es renovarà la xarxa de sanejament actual en tot el seu traçat i s'implantarà una nova xarxa de reg automàtic per l'arbrat. Els paviments es realitzaran tenint en compte la normativa d'accessibilitat i seguint els criteris definits a projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit.

Fases d'obra (*)

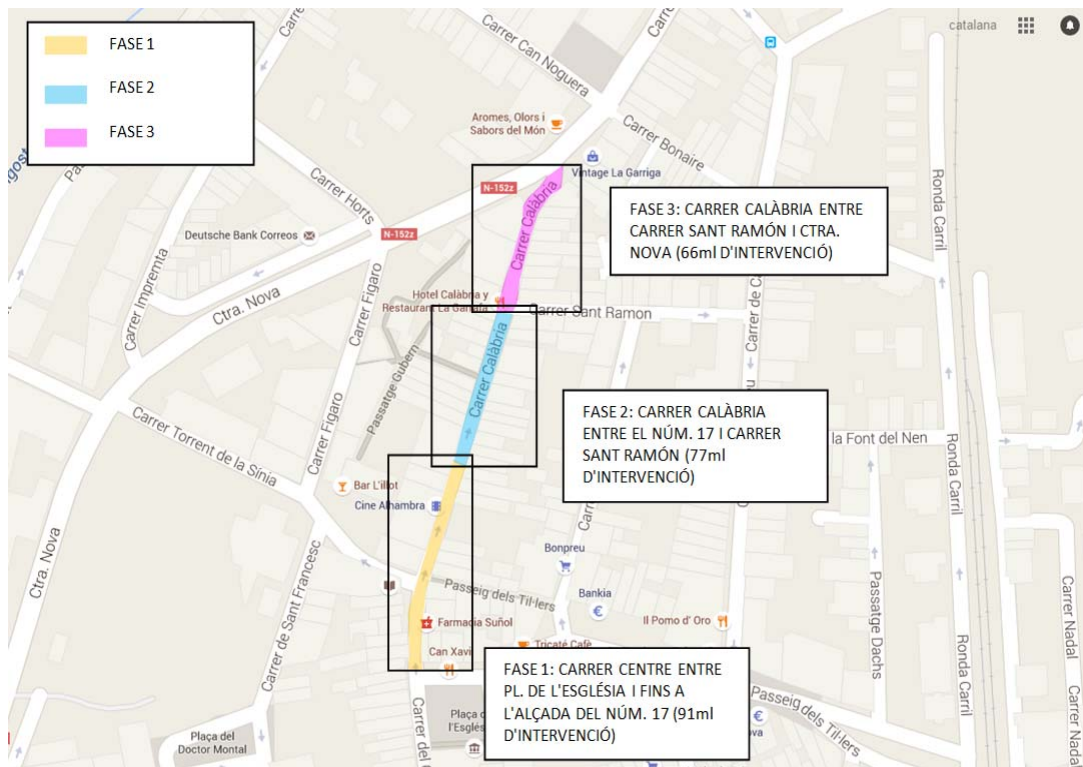

(*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial

Inici de l'obra	14/06/2016	Termini previst	5 MESOS
Final de l'obra	-	Període complert	1 setmana
Promotor	AJUNTAMENT DE LA GARRIGA		
Contractista	CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL.		
	Camí de Can Calders 10A, entl. 08173 Sant Cugat del Vallès 93. 589.02.46		

<i>PERSONAL RESPONSABLE</i>	
Cap d'obra	JAVIER CASTILLEJO
Encarregat	AGUSTÍN MARTÍNEZ
Atenció telemàtica	OFICINA TÈCNICA estudis@cic3.com 679.072.618
<i>INFORME D'OBRA</i>	
Període	14/06/2016 - 20/06/2016
Fase d'obra	Fase 1. Àmbit carrer Centre
<u>Tasques desenvolupades</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Realització de treballs d'implantació amb la disposició d'una oficina d'obra a l'encreuament del carrer Calàbria amb ctra. Nova; la qual disposa d'una bústia i panell amb les dades de contacte. També es disposa d'un mòdul de vestidors al carrer Torrent de la Sínia entre el carrer del Figueró i el carrer Calàbria (veure doc. gràfica) 	
<ul style="list-style-type: none"> Replanteig de l'obra Disposició de tancament de l'obra corresponent a l'àmbit de la Fase 1 (des de la Plaça de l'Església fins a l'alçada del núm. 17 del carrer Calàbria sense que l'aparcament existent es vegi afectat) (veure doc. gràfica) 	
<ul style="list-style-type: none"> Demolició de llambordins i de la base de formigó a l'àmbit del carrer Centre (fase 1A) 	
<ul style="list-style-type: none"> Execució de cates amb mitjans manuals per a la localització de serveis soterrats existents i del col·lector antic 	
<u>Aspectes a destacar</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Abans de l'inici de l'obra es va realitzar una reunió informativa amb els veïns i comerciants afectats S'han implantat diferents canals de comunicació amb els responsables de l'obra per a atendre de forma personalitzada als veïns. Per altra banda, s'estan desenvolupant mesures per a donar una atenció més pròxima als veïns. 	

Accessibilitat

- S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues mòbils (veure doc. gràfica)

INFORMACIÓ GRÀFICA

Instal·lacions d'obra (oficina i vestuaris, respectivament)

(1)



(2)



Tancaments d'obra i treballs en execució

(3)



(4)



(5)



(6)

