

INFORME SETMANAL D'OBRA

5/07/2016 - 11/07/2016

OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA

INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA

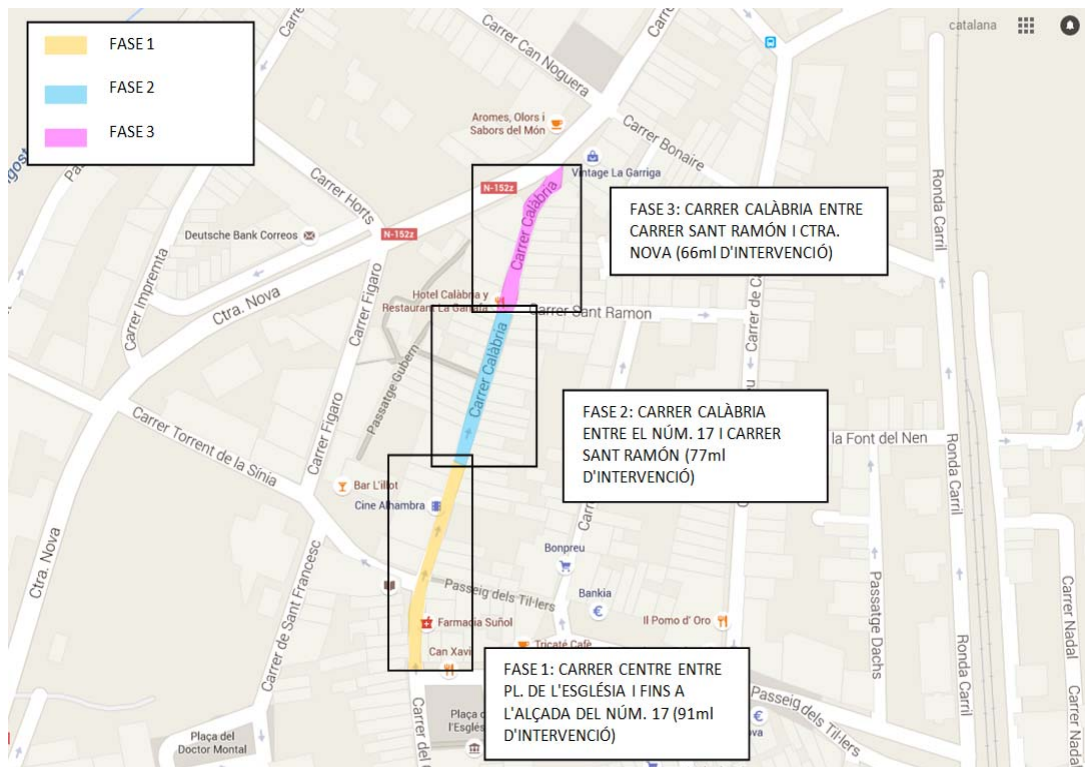
Emplaçament

Les obres de rehabilitació d'un tram del carrer Calàbria es localitzen al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) fins a arribar a l'encreuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova; el que correspon a una superfície total d'actuació de 1.900m².

Objecte de l'obra




Les obres tenen per objecte la modificació de la secció actual per crear unes zones amb prioritat als vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les xarxes soterrades existents al nou nivell de paviment. Addicionalment, es renovarà la xarxa de sanejament actual en tot el seu traçat i s'implantarà una nova xarxa de reg automàtic per l'arbrat. Els paviments es realitzaran tenint en compte la normativa d'accessibilitat i seguint els criteris definits a projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit.

Fases d'obra (*)



(*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial

Inici de l'obra	14/06/2016	Termini previst	5 MESOS
Final de l'obra	-	Període complert	4 setmanes
Promotor	AJUNTAMENT DE LA GARRIGA		
Contractista	CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL.		
	Camí de Can Calders 10A, entl. 08173 Sant Cugat del Vallès 93. 589.02.46		

PERSONAL RESPONSABLE	
Cap d'obra	JAVIER CASTILLEJO
Encarregat	AGUSTÍN MARTÍNEZ
Atenció telemàtica	OFICINA TÈCNICA estudis@cic3.com 679.072.618
INFORME D'OBRA	
Període	5/07/2016 - 11/07/2016
Fase d'obra	Fase 1. Àmbit carrer Centre i 1r tram carrer Calàbria
Tasques desenvolupades	
<ul style="list-style-type: none">• Manteniment i neteja de runa procedent dels treballs d'enderroc i moviment de terres del paviment de la vorera i del col·lector existent. (veure doc. gràfica) 	
<ul style="list-style-type: none">• Disposició d'un tram del nou tub col·lector i connexió a la xarxa existent. Treballs de moviment de terres per soterrar la nova instal·lació. (veure doc. gràfica) 	
<ul style="list-style-type: none">• Execució de treballs de neteja i condicionament del pas de vianants habilitat entre el carrer Torrent de la Sínia i el carrer Calàbria. En data 8 de juliol.• Connexió de la instal·lació d'aigua provisional per a poder executar properament treballs d'enderroc a la vorera. En data 11 de juliol. 	
Aspectes a destacar	
<ul style="list-style-type: none">• Abans de l'inici de l'obra es va realitzar una reunió informativa amb els veïns i comerciants afectats.• S'han implantat diferents canals de comunicació amb els responsables de l'obra per a atendre de forma personalitzada als veïns. Per altra banda, s'estan desenvolupant mesures per a donar una atenció més pròxima als veïns.	

- En data 5 de juliol es va implantar la figura d'agent cívic a l'obra per garantir que es compleixin les normes més elementals de civisme, vetllant per una bona convivència entre la ciutadania i les obres.
- La oficina de comunicacions de l'empresa ha fet seguiment de les consultes del veïns per tal de resoldre-les.

Accessibilitat

- S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues mòbils. (veure doc. gràfica)

INFORMACIÓ GRÀFICA

Treballs realitzats

(1)



(2)





(3)



(4)



(5)
