

INFORME SETMANAL D'OBRA
29/11/2016 -05/12/2016

OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA

INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA


Emplaçament

Les obres de rehabilitació d'un tram del carrer Calàbria es localitzen al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) fins a arribar a l'encreuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova; el que correspon a una superfície total d'actuació de 1.900m².

Objecte de l'obra

Les obres tenen per objecte la modificació de la secció actual per crear unes zones amb prioritat als vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les xarxes soterrades existents al nou nivell de paviment. Addicionalment, es renovarà la xarxa de sanejament actual en tot el seu traçat i s'implantarà una nova xarxa de reg automàtic per l'arbrat. Els paviments es realitzaran tenint en compte la normativa d'accessibilitat i seguint els criteris definits al projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit.

Fases d'obra (*)

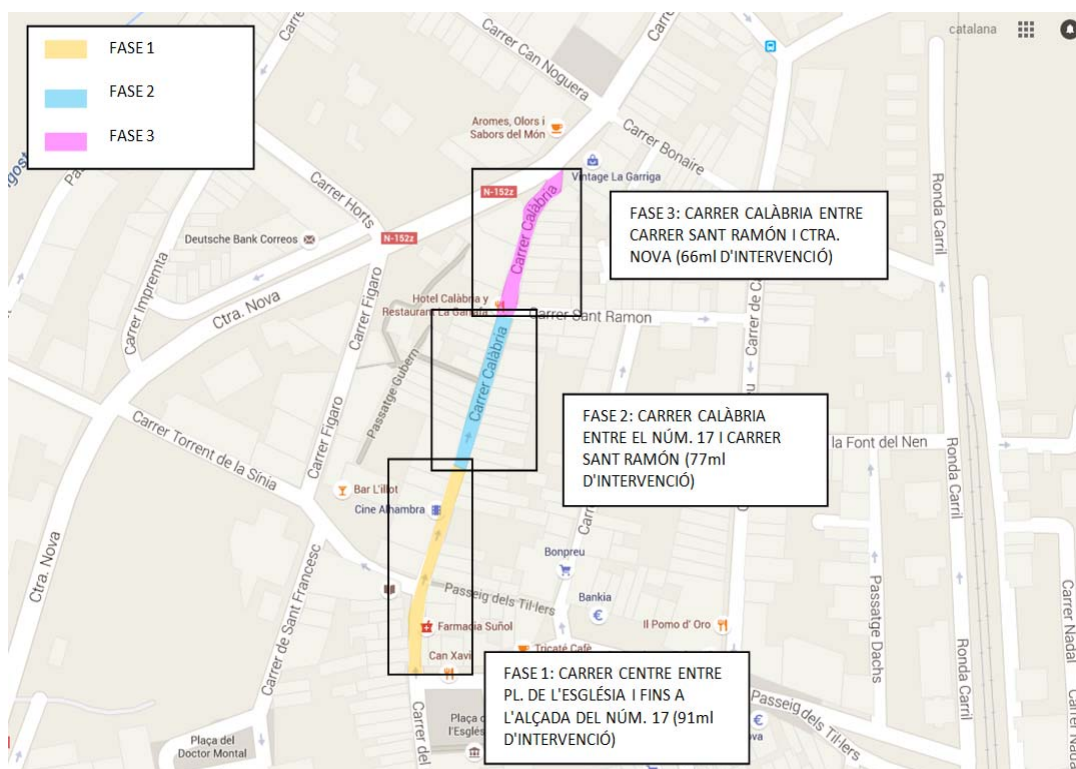

(*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial

Inici de l'obra	14/06/2016	Termini previst	5 MESOS
Final de l'obra	-	Període complert	24 setmanes
Promotor	AJUNTAMENT DE LA GARRIGA		
Contractista	CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL.		
	Camí de Can Calders 10A, entl. 08173 Sant Cugat del Vallès 93. 589.02.46		

<i>PERSONAL RESPONSABLE</i>	
Cap d'obra	JAVIER CASTILLEJO
Encarregat	AGUSTÍN MARTÍNEZ
Atenció telemàtica	OFICINA TÈCNICA estudis@cic3.com 679.072.618
<i>INFORME D'OBRA</i>	
Període	29/11/2016 - 05/12/2016
Fase d'obra	Fase 4. Àmbit global. Treballs finals
<p><u>Tasques desenvolupades</u></p> <p>Durant aquesta darrera setmana s'han desenvolupat les tasques següents en tot l'àmbit d'obra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'han finalitzat els treballs de col·locació de les columnes d'enllumenat • S'han executat els acabats de paviments i de façanes que quedaven pendents • S'ha realitzat el pintat de la senyalització horitzontal a calçada i la disposició de senyals • S'han instal·lat els diferents elements de mobiliari urbà (bancs i papereres) • S'han tancat les rases que s'havien obert pel pas de les canalitzacions d'aigua potable que va disposar la companyia al passatge des Til·lers i al passatge Gubern. 	
<p><u>Aspectes a destacar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La figura de l'agent cívic es troba de forma permanent a l'obra per tal de donar assistència i informació als veïns i vianants que transiten per la zona. • S'han implantat diferents canals de comunicació amb els responsables de l'obra per a atendre de forma personalitzada als veïns. Aquestes són: dues línies telefòniques d'assistència i informació, un correu electrònic i una bústia situada al núm. 10 del carrer Calàbria per a la recollida de consultes, dubtes i suggeriments. • La oficina de comunicacions de l'empresa està oberta a les consultes de veïns no només a través dels canals d'informació sinó també a través de les xarxes socials i en cooperació amb el departament de mitjans de comunicació de l'Ajuntament de La Garriga • Durant els treballs que comporten excés de pols, estem ampliant les nostres mesures de prevenció per minimitzar les emissions i agraint a tots els locals comercials de la zona la seva col·laboració per tal de reduir l'acumulació d'ambients pulverulents. 	
<p><u>Accessibilitat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues mòbils; un tancament adequat a les característiques de l'entorn. Aquests itineraris són amples per 	



tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i atenent a l'afluència de vianants a l'àmbit.

INFORMACIÓ GRÀFICA ADDICIONAL (vista de l'estat actual del carrer Calàbria)



