

INFORME SETMANAL D'OBRA

12/07/2016 - 18/07/2016

OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA

INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA


Emplaçament

Les obres de rehabilitació d'un tram del carrer Calàbria es localitzen al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) fins a arribar a l'encreuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova; el que correspon a una superfície total d'actuació de 1.900m².

Objecte de l'obra

Les obres tenen per objecte la modificació de la secció actual per crear unes zones amb prioritat pels vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les xarxes soterrades existents al nou nivell de paviment. Addicionalment, es renovarà la xarxa de sanejament actual en tot el seu traçat i s'implantarà una nova xarxa de reg automàtic per l'arbrat. Els paviments es realitzaran tenint en compte la normativa d'accessibilitat i seguint els criteris definits a projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit.

Fases d'obra (*)

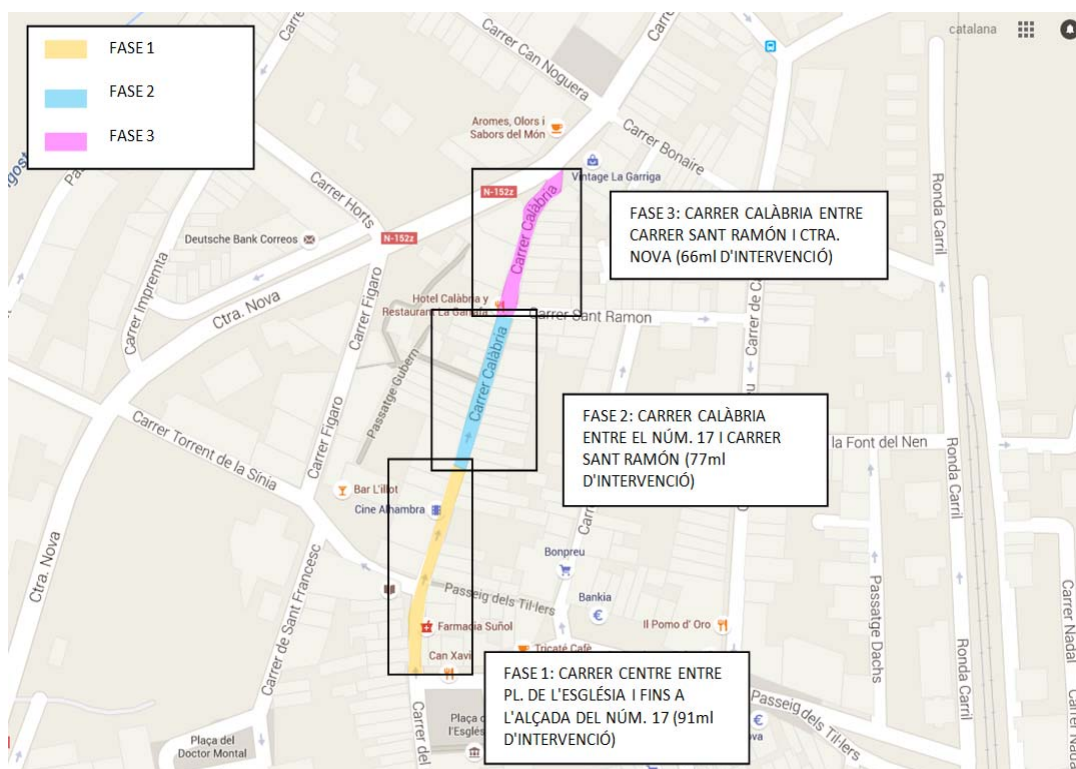

(*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------|
| Inici de l'obra | 14/06/2016 | Termini previst | 5 MESOS |
| Final de l'obra | - | Període complert | 5 setmanes |
| Promotor | AJUNTAMENT DE LA GARRIGA | | |
| Contractista | CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL. | | |
| | Camí de Can Calders 10A, entl. 08173 Sant Cugat del Vallès 93. 589.02.46 | | |

| <i>PERSONAL RESPONSABLE</i> | |
|---|---|
| Cap d'obra | JAVIER CASTILLEJO |
| Encarregat | AGUSTÍN MARTÍNEZ |
| Atenció telemàtica | OFICINA TÈCNICA estudis@cic3.com 679.072.618 |
| <i>INFORME D'OBRA</i> | |
| Període | 12/07/2016 - 18/07/2016 |
| Fase d'obra | Fase 1. Àmbit carrer Centre i 1r tram carrer Calàbria |
| <u>Tasques desenvolupades</u> | |
| <ul style="list-style-type: none"> S'han cobert les restes arqueològiques i han començat els treballs de demolició de la vorera est. Es disposa d'un itinerari ample pel pas de vianants per la vorera oest i s'habiliten els corresponents accessos als locals existents (primers dies de la setmana) | |
| | |
| | |
| <ul style="list-style-type: none"> S'ha col·locat el cartell amb la informació de l'obra a l'inici del tram del carrer Calàbria (cruïlla amb carretera Nova) al costat de l'oficina d'obra. (13 de juliol) | |
| | |
| | |
| | |

- Obertura de rases per a la canalització de serveis a la vorera i pas de les canalitzacions a soterrar(últims dies de la setmana)
- Realització de connexions provisionals d'aigua (mitjans de setmana)
- Realització de cates per a la localització de serveis per part de l'empresa SOREA

Aspectes a destacar

- La figura de l'agent cívic es troba de forma permanent a l'obra per tal de donar assistència i informació als veïns i vianants que transiten per la zona.
- S'han implantat diferents canals de comunicació amb els responsables de l'obra per a atendre de forma personalitzada als veïns. Aquestes són: dues línies telefòniques d'assistència i informació, un correu electrònic i una bústia situada a la caseta d'obra de davant de l'antic forn del Sol per a la recollida de consultes, dubtes i suggeriments.
- La oficina de comunicacions de l'empresa està oberta a les consultes de veïns no només a través dels canals d'informació sinó també a través de les xarxes socials i en cooperació amb el departament de mitjans de comunicació de l'Ajuntament de La Garriga.
- Durant els treballs d'enderroc i moviment de terres hi ha hagut la presència permanent d'un arqueòleg a peu d'obra

Accessibilitat

- S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues mòbils; un tancament adequat a les característiques de l'entorn. Aquests itineraris són amples per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i atenent a l'afluència de vianants a l'àmbit.

INFORMACIÓ GRÀFICA ADDICIONAL

Itineraris habilitats



(1)



(2)
