

INFORME SETMANAL D'OBRA

21/06/2016 - 27/06/2016

OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA

INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA


Emplaçament

Les obres de rehabilitació d'un tram del carrer Calàbria es localitzen al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) fins a arribar a l'encreuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova; el que correspon a una superfície total d'actuació de 1.900m².

Objecte de l'obra



Les obres tenen per objecte la modificació de la secció actual per crear unes zones amb prioritat pels vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les xarxes soterrades existents al nou nivell de paviment. Addicionalment, es renovarà la xarxa de sanejament actual en tot el seu traçat i s'implantarà una nova xarxa de reg automàtic per l'arbrat. Els paviments es realitzaran tenint en compte la normativa d'accessibilitat i seguint els criteris definits a projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit.


Fases d'obra (*)

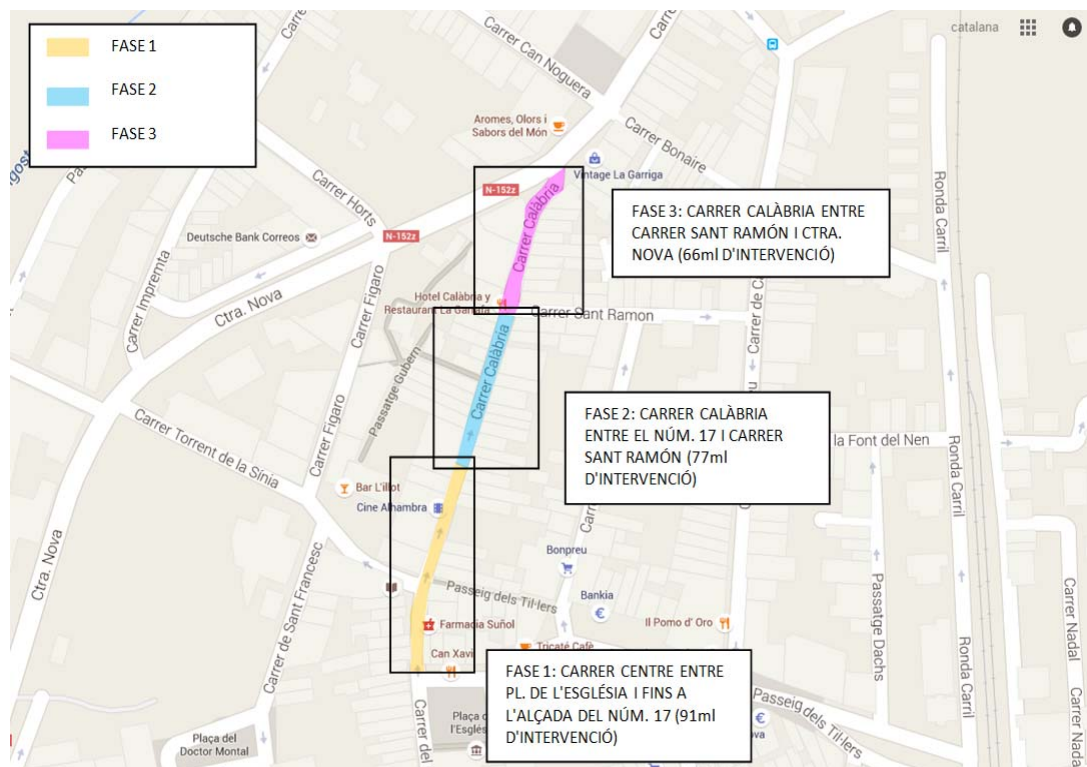

(*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial

Inici de l'obra	14/06/2016	Termini previst	5 MESOS
Final de l'obra	-	Període complert	2 setmanes
Promotor	AJUNTAMENT DE LA GARRIGA		
Contractista	CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL.		
	Camí de Can Calders 10A, entl. 08173 Sant Cugat del Vallès 93. 589.02.46		

<i>PERSONAL RESPONSABLE</i>	
Cap d'obra	JAVIER CASTILLEJO
Encarregat	AGUSTÍN MARTÍNEZ
Atenció telemàtica	OFICINA TÈCNICA estudis@cic3.com 679.072.618
<i>INFORME D'OBRA</i>	
Període	21/06/2016 - 27/06/2016
Fase d'obra	Fase 1. Àmbit carrer Centre i 1r tram carrer Calàbria
<u>Tasques desenvolupades</u>	
<ul style="list-style-type: none">Execució de cates amb mitjans manuals per a la localització de serveis soterrats existents i del col·lector antic. En data 21 de juny, sobre les 12:00 a.m., es produeix una incidència a la xarxa d'aigua potable degut al trencament d'una canonada a l'alçada del núm. 8 del carrer Centre, a la zona de vorera, al costat de la Plaça de l'Església. Cal esmentar que els tècnics disposaven dels plànols de serveis de la companyia subministradora, Aigües de Vilanova, i que procedint a la realització de cates manuals per a la localització dels serveis, s'ha produït el trencament de la canonada ja que aquesta es troba a una cota per sobre del que requereix la normativa i no està degudament senyalitzada, a més en el moment de la cata es trobava just sota un fragment de pedra. Paral·lelament els tècnics han detectat que la canonada en qüestió és antiga i es troba originàriament en mal estat. (veure doc. gràfica). El temps d'afectació ha sigut inferior a 2,5 hores	
	
<ul style="list-style-type: none">Continuen els treballs d'enderroc i moviment de terres per a la localització del col·lector existent i a mig metre per sota de la rasant del carrer apareixen restes arqueològiques corresponents a les bases dels antics murs de façana dels edificis d'aquest sector. A partir de la tarda del dia 21 de juny fins a l'actualitat està present a l'obra un arqueòleg per fer l'estudi d'aquestes restes. Aquest compta amb dos operaris de Cic3 per a ajudes a l'excavació. (veure doc. gràfica)	
	
<p>Es continua excavant al llarg de la setmana per a la localització del col·lector i per trobar el final del mur de les restes trobades. (veure doc. gràfica)</p>	
<ul style="list-style-type: none">Manteniment i neteja de l'àmbit d'obres de forma diària conservant els accessos habilitats i, molt especialment durant la tarda de dijous (23 de juny) per a deixar la zona lliure d'obres durant la festivitat de Sant Joan i el cap de setmana	

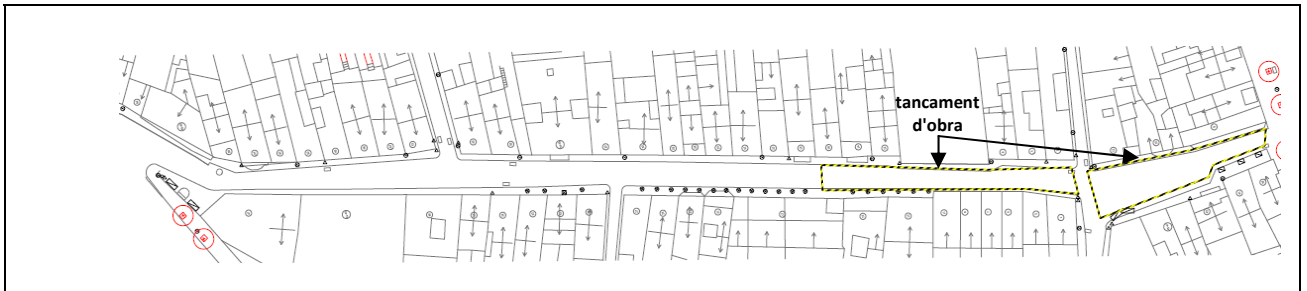

Aspectes a destacar

- Abans de l'inici de l'obra es va realitzar una reunió informativa amb els veïns i comerciants afectats
- S'han implantat diferents canals de comunicació amb els responsables de l'obra per a atendre de forma personalitzada als veïns. Per altra banda, s'estan desenvolupant mesures per a donar una atenció més pròxima als veïns.

Accessibilitat

- S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues mòbils (veure doc. gràfica)

INFORMACIÓ GRÀFICA

Trencament de la canonada d'aigua potable



(1)



(2)

Arqueòleg i operaris



(3)



(4)

Treballs realitzats



(5)



(6)
