

INFORME SETMANAL D'OBRA

09/08/2016 - 12/08/2016

OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA

INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA


Emplaçament

Les obres de rehabilitació d'un tram del carrer Calàbria es localitzen al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) fins a arribar a l'encreuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova; el que correspon a una superfície total d'actuació de 1.900m2.

Objecte de l'obra

Les obres tenen per objecte la modificació de la secció actual per crear unes zones amb prioritat pels vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les xarxes soterrades existents al nou nivell de paviment. Addicionalment, es renovarà la xarxa de sanejament actual en tot el seu traçat i s'implantarà una nova xarxa de reg automàtic per l'arbrat. Els paviments es realitzaran tenint en compte la normativa d'accessibilitat i seguint els criteris definits a projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit.

Fases d'obra (*)

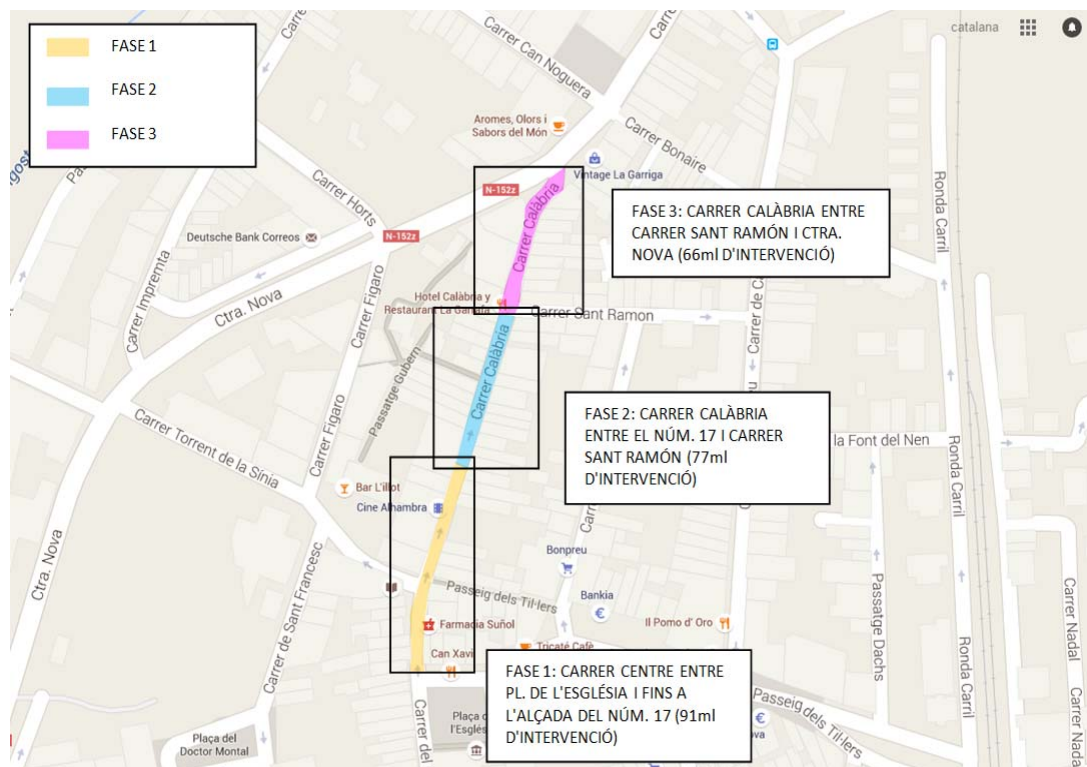

(*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial


Inici de l'obra	14/06/2016	Termini previst	5 MESOS
Final de l'obra	-	Període complert	9 setmanes
Promotor	AJUNTAMENT DE LA GARRIGA		
Contractista	CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL.		
	Camí de Can Calders 10A, entl. 08173 Sant Cugat del Vallès 93. 589.02.46		

<i>PERSONAL RESPONSABLE</i>	
Cap d'obra	JAVIER CASTILLEJO
Encarregat	AGUSTÍN MARTÍNEZ
Atenció telemàtica	OFICINA TÈCNICA estudis@cic3.com 679.072.618


<i>INFORME D'OBRA</i>	
Període	09/08/2016 - 12/08/2016
Fase d'obra	Fase 1. Àmbit carrer Centre i 1r tram carrer Calàbria

Tasques desenvolupades


- Finalització dels treballs de soterrament de xarxes de serveis en tot el tram comprès a la primera fase (91ml). Es van passar els tubs per les instal·lacions i es va reblir la rasa amb terres.



- Formació de la caixa de paviment amb la correcta compactació del terreny per a la posterior formació de la base de formigó de la pavimentació



- Formigonat de la base de formigó en tot el tram de la fase 1. S'han adaptat els accessos amb pendents suaus evitant desnivell en la trobada amb altres paviments (límit fase 1 amb fase 2)



- Un cop realitzats els treballs al tram de la fase 1 es procedeix a la neteja intensiva dels accessos i del vial i s'habiliten passos degudament delimitats i senyalitzats pels vianants.



Aspectes a destacar

- La figura de l'agent cívic es troba de forma permanent a l'obra per tal de donar assistència i informació als veïns i vianants que transiten per la zona.
- S'han implantat diferents canals de comunicació amb els responsables de l'obra per a atendre de forma personalitzada als veïns. Aquestes són: dues línies telefòniques d'assistència i informació, un correu electrònic i una bústia situada a la caseta d'obra de davant de l'antic forn del Sol per a la recollida de consultes, dubtes i suggeriments.
- La oficina de comunicacions de l'empresa està oberta a les consultes de veïns no només a través dels canals d'informació sinó també a través de les xarxes socials i en cooperació amb el departament de mitjans de comunicació de l'Ajuntament de La Garriga.
- Durant els treballs d'enderroc i moviment de terres hi ha hagut la presència permanent d'un arqueòleg a peu d'obra.
- Durant els treballs que comportin excés de pols, estem ampliant les nostres mesures de prevenció per minimitzar les emissions i agraint a tots els locals comercials de la zona la seva col·laboració per tal de reduir l'acumulació d'ambients pulverulents.

Accessibilitat

- S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues mòbils; un tancament adequat a les característiques de l'entorn. Aquests itineraris són amples per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i atenent a l'afluència de vianants a l'àmbit.

INFORMACIÓ GRÀFICA ADDICIONAL



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)
