

INFORME SETMANAL D'OBRA
18/10/2016 - 24/10/2016

OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA

INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA


Emplaçament

Les obres de rehabilitació d'un tram del carrer Calàbria es localitzen al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) fins a arribar a l'encreuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova; el que correspon a una superfície total d'actuació de 1.900m².

Objecte de l'obra

Les obres tenen per objecte la modificació de la secció actual per crear unes zones amb prioritat pels vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les xarxes soterrades existents al nou nivell de paviment. Addicionalment, es renovarà la xarxa de sanejament actual en tot el seu traçat i s'implantarà una nova xarxa de reg automàtic per l'arbrat. Els paviments es realitzaran tenint en compte la normativa d'accessibilitat i seguint els criteris definits a projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit.

Fases d'obra (*)

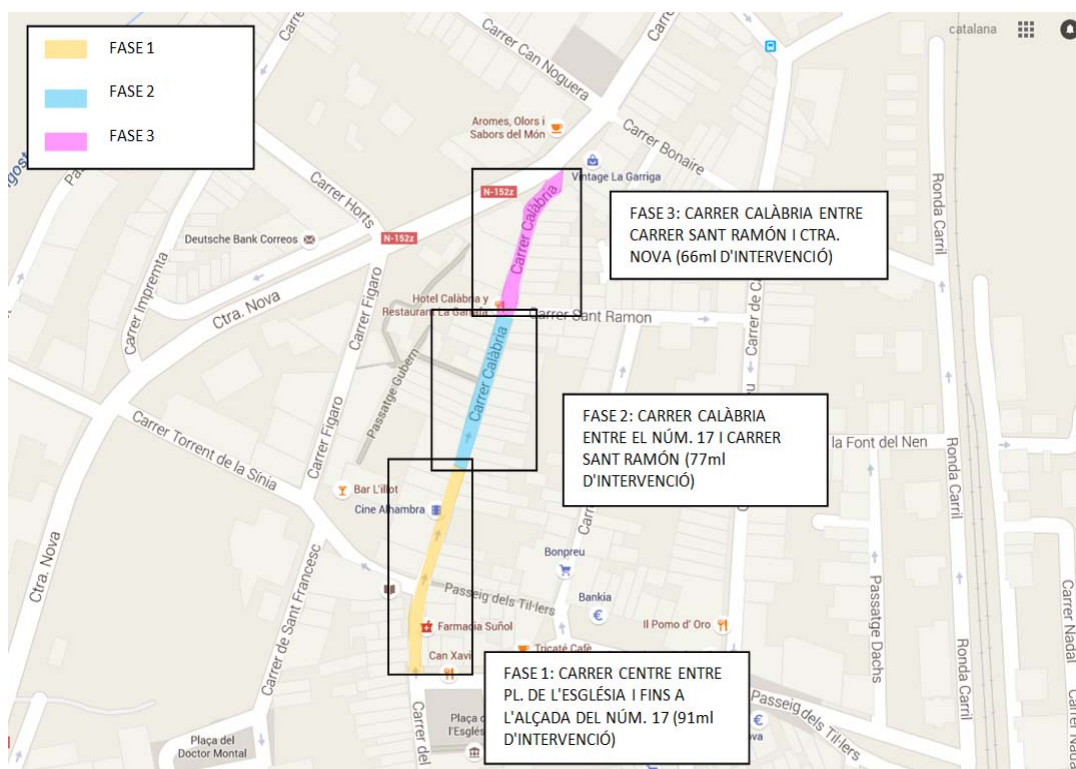

(*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial

Inici de l'obra	14/06/2016	Termini previst	5 MESOS
Final de l'obra	-	Període complert	18 setmanes
Promotor	AJUNTAMENT DE LA GARRIGA		
Contractista	CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL.		
	Camí de Can Calders 10A, entl. 08173 Sant Cugat del Vallès 93. 589.02.46		

PERSONAL RESPONSABLE	
Cap d'obra	JAVIER CASTILLEJO
Encarregat	AGUSTÍN MARTÍNEZ
Atenció telemàtica	OFICINA TÈCNICA estudis@cic3.com 679.072.618
INFORME D'OBRA	
Període	18/10/2016 - 24/10/2016
Fase d'obra	Fase 3. Àmbit carrer Calàbria fins a carretera Nova
Tasques desenvolupades	
<p>Durant aquesta divuitena setmana s'han desenvolupat les tasques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es comencen els treballs a la vorera de la fase III. S'ha demolit el paviment pertinet a la vorera parell, s'han executat les excavacions per al pas de les instal·lacions, les quals es van disposar posteriorment. • Finalment, es va formigonar la vorera per tal d'habilitar un pas pels vianants i poder començar els treballs a l'altra vorera, els quals s'han iniciat en data 24/10. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Paral·lelament a aquests treballs, s'ha començat a demolir el paviment de la cantonada del carrer Calàbria amb Torrent de la Sínia. També s'ha començat a col·locar el paviment definitiu des de la Plaça de l'Església fins al final de la fase I. • Degut als treballs de pavimentació s'ha acordat junt amb la Direcció Facultativa restringir el pas del tràfic rodat per tal d'evitar que es produeixin desperfectes a les noves peces col·locades. Pel que fa als vianants, se'ls hi habilitaran passos i accessos amb les corresponents mesures de seguretat. • El carrer Sant Ramon disposa de paviment de formigó per a permetre el pas del trànsit, per aquest motiu, s'ha proposat un itinerari alternatiu per als veïns de l'aparcament afectat a la fase I. Hauran de sortir i entrar per aquest carrer i no pel carrer Calàbria. S'han disposat cartells per tal d'informar als veïns. 	
<p style="text-align: center;">Aparcament afectat</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Diàriament, es procedeix a la neteja dels accessos i del vial i s'habiliten passos degudament delimitats i senyalitzats pels vianants. En aquesta tercera fase, els vianants circulen lliurement per la calçada i hi ha disposades tanques grogues mòbils per protegir els vianants de la zona d'obres o obstacles que hi pugui haver. Les voreres es troben afectades per les obres però s'han disposat elements per a garantir els accessos en tot moment. 	

- Actualment l'accés per la vorera imparell està restringit per obres i hi ha disposats taulons per a salvar desnivells entre la rasant de les voreres amb la de la calçada i per cadascun dels accessos i creuament de carrers.
- Periòdicament es realitzen regs amb aigua del carrer per evitar la propagació de pols i la neteja del vial per mitjà d'escombradores que recullen les restes de terres i materials d'obra.

Aspectes a destacar

- La figura de l'agent cívic es troba de forma permanent a l'obra per tal de donar assistència i informació als veïns i vianants que transiten per la zona.
- S'han implantat **diferents canals de comunicació** amb els responsables de l'obra per a atendre de forma personalitzada als veïns. Aquestes són: dues línies telefòniques d'assistència i informació, un correu electrònic i una bústia situada al núm. 10 del carrer Calàbria per a la recollida de consultes, dubtes i suggeriments.
- **La oficina de comunicacions de l'empresa està oberta a les consultes de veïns** no només a través dels canals d'informació sinó també a través de les xarxes socials i en cooperació amb el departament de mitjans de comunicació de l'Ajuntament de La Garriga
- Durant els treballs que comporten excés de pols, estem ampliant les nostres mesures de prevenció per minimitzar les emissions i agraint a tots els locals comercials de la zona la seva col·laboració per tal de reduir l'acumulació d'ambients pulverulents.



Accessibilitat

- S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues mòbils; un tancament adequat a les característiques de l'entorn. Aquests itineraris són amples per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i atenent a l'afluència de vianants a l'àmbit.

INFORMACIÓ GRÀFICA ADDICIONAL



(1)

Vista dels treballs de pavimentar vorera parell (FASE III)



(2)

Vistes de l'estat actual del carrer Sant Ramón (FASE III)



(3)

Vista dels treballs de pavimentació (FASE I)
