

**INFORME SETMANAL D'OBRA**  
**20/09/2016 - 26/09/2016**

**OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA**

**INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA**


Emplaçament

Les obres de rehabilitació d'un tram del carrer Calàbria es localitzen al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) fins a arribar a l'encreuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova; el que correspon a una superfície total d'actuació de 1.900m<sup>2</sup>.

Objecte de l'obra

Les obres tenen per objecte la modificació de la secció actual per crear unes zones amb prioritat pels vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les xarxes soterrades existents al nou nivell de paviment. Addicionalment, es renovarà la xarxa de sanejament actual en tot el seu traçat i s'implantarà una nova xarxa de reg automàtic per l'arbrat. Els paviments es realitzaran tenint en compte la normativa d'accessibilitat i seguint els criteris definits a projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit.

Fases d'obra (\*)

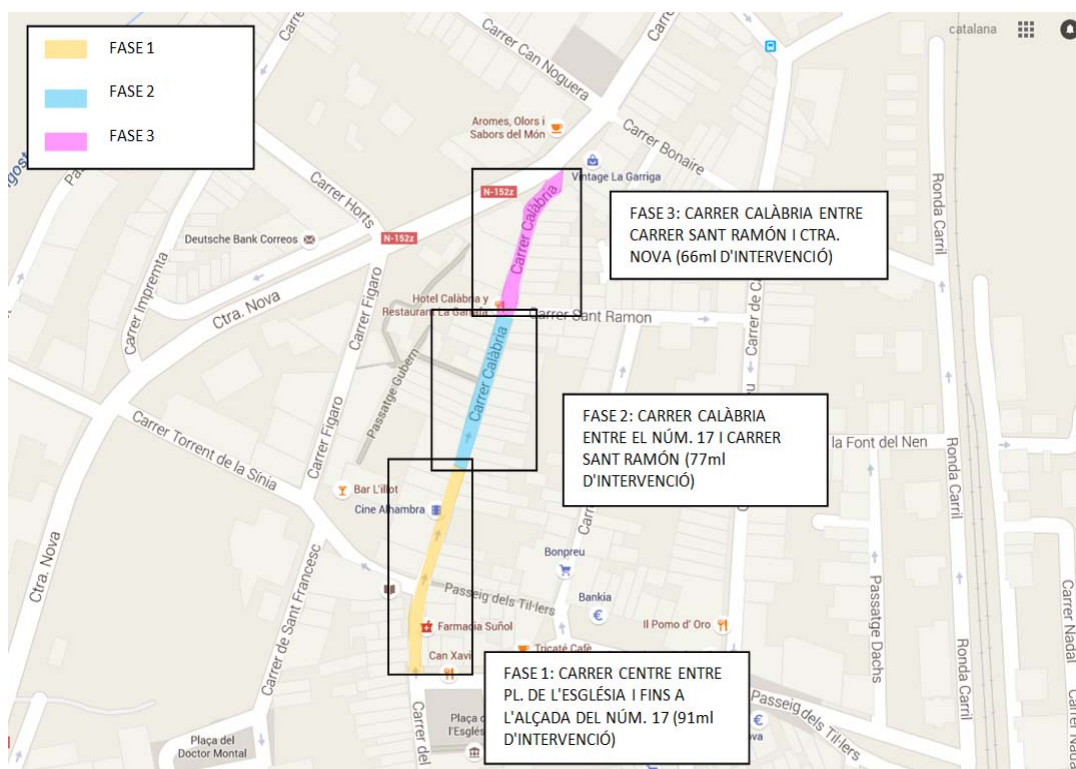

(\*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial

Inici de l'obra	14/06/2016	Termini previst	5 MESOS
Final de l'obra	-	Període complert	14 setmanes
Promotor	<b>AJUNTAMENT DE LA GARRIGA</b>		
Contractista	<b>CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL.</b>		
	Camí de Can Calders 10A, entl. 08173 Sant Cugat del Vallès 93. 589.02.46		

<b>PERSONAL RESPONSABLE</b>	
Cap d'obra	JAVIER CASTILLEJO
Encarregat	AGUSTÍN MARTÍNEZ
Atenció telemàtica	OFICINA TÈCNICA estudis@cic3.com 679.072.618
<b>INFORME D'OBRA</b>	
Període	20/09/2016 - 26/09/2016
Fase d'obra	Fase 2. Àmbit carrer Calàbria fins a carrer Sant Ramón
<p><u>Tasques desenvolupades</u></p> <p>Durant aquesta catorzena setmana s'han desenvolupat les tasques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es va demolir el paviment de la vorera oest i es van començar els treballs d'excavació per soterrament de xarxes de serveis. Degut als treballs de moviment de terres s'ha anat regant per evitar l'excés de pols i es van habilitar taulons per tal de salvar les rases de cara al cap de setmana.</li> </ul> <p>Als guals afectats se'ls hi ha aplicat una base de sauló per salvar els desnivells i treure les planxes metàl·liques.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En motiu de la climatologia prevista pel cap de setmana es va executar unes rases per a evacuar l'aigua cap al pou situat entre el C/ Calàbria i el C/ Sant Ramon i evitar que la zona d'obres quedés enfangada.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diàriament, es procedeix a la neteja dels accessos i del vial i s'habiliten passos degudament delimitats i senyalitzats pels vianants. En aquesta segona fase, els vianants circulen per les voreres degudament delimitades i senyalitzades de la zona d'obres per un tancat perimetral amb tanca groga mòbil; tal i com es va realitzar en la primera fase. També s'han habilitat accessos amb taulons a la vorera on s'estan realitzant treballs.</li> </ul>	

### Aspectes a destacar

- La figura de l'agent cívic es troba de forma permanent a l'obra per tal de donar assistència i informació als veïns i vianants que transiten per la zona.
  - S'han implantat **diferents canals de comunicació** amb els responsables de l'obra per a atendre de forma personalitzada als veïns. Aquestes són: dues línies telefòniques d'assistència i informació, un correu electrònic i una bústia situada al núm. 10 del carrer Calàbria per a la recollida de consultes, dubtes i suggeriments.
- 
- **La oficina de comunicacions de l'empresa està oberta a les consultes de veïns** no només a través dels canals d'informació sinó també a través de les xarxes socials i en cooperació amb el departament de mitjans de comunicació de l'Ajuntament de La Garriga.
  - Durant els treballs d'enderroc i moviment de terres hi ha la presència permanent d'un arqueòleg a peu d'obra.
  - Durant els treballs que comporten excés de pols, estem ampliant les nostres mesures de prevenció per minimitzar les emissions i agraint a tots els locals comercials de la zona la seva col·laboració per tal de reduir l'acumulació d'ambients pulverulents.

### Accessibilitat

- S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues mòbils; un tancament adequat a les característiques de l'entorn. Aquests itineraris són amples per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i atenent a l'afluència de vianants a l'àmbit.

### *INFORMACIÓ GRÀFICA ADDICIONAL*



(1)



(2)



(3)
